DOCUMENT 3 / 3

# Business plan de l'investissement

L'investissement analysé est le bâtiment locatif de 6 logements. La villa, occupée par le propriétaire, entre dans le plan de financement global mais ne produit pas de revenu. Tous les calculs sont repris dans le classeur Excel joint, avec des hypothèses modifiables.

**124,0 M**
Investissement locatif en montage optimisé (S4, HT, frais compris, hors foncier)

**1 200 000**
Loyers mensuels potentiels en location nue (FCFA)

**8,9 %**
Rendement net stabilisé (S4) · 5,8 % en S1

**10,0 %**
TRI sur 15 ans sans crédit (S4) · 5,1 % en S1

## Ce qu'il faut retenir

- **Confié à des entreprises au coût TTC (S1), le locatif ne rapporte pas assez** : TRI de 5,1 %, rendement net de 5,8 %, et les loyers ne couvrent pas une annuité de crédit (couverture de 0,83). C'est la conclusion honnête après intégration de la revue senior (aléas à 10 %, équipements, gardien).
- **En montage optimisé (S4), l'opération atteint 10,0 %** avec le même loyer. Les leviers : marchés par lots avec des artisans non assujettis à la TVA, conception assurée par le maître d'ouvrage (architecte), gestion en direct, gardien partagé avec la villa. Le capital est récupéré en environ 11 ans, la couverture de dette est de 1,27.
- **Repères pour décider** : pour un TRI de 10 % en location nue gérée par agence, il faut un coût de construction d'au plus 98,0 M (362 833 FCFA/m² tout compris), ou des loyers de 336 709 / 204 953 FCFA, au-dessus du marché.
- **Le meublé (S2) et la courte durée (S3) ne sont pas intéressants ici** : la prime de loyer est absorbée par les charges incluses, les commissions et 24 M de mobilier. La courte durée peut se tester sur 1 ou 2 T1 bis seulement.
- **Ne pas lancer le locatif tant que les devis par lots ne confirment pas un coût proche de celui de S4** (120,5 M HT hors frais annexes).

## Résultats par scénario

| Indicateur | S1 · Location nue longue duree | S4 · Location nue, montage optimise | S2 · Meuble moyenne duree (1 a 6 mois) | S3 · Courte duree (plateformes) |
|---|---|---|---|---|
| Coût de construction retenu | 152,0 M | 120,5 M | 152,0 M | 152,0 M |
| Investissement (hors foncier) | 155,5 M | 124,0 M | 179,5 M | 179,5 M |
| Revenu annuel stabilisé | 13,5 M | 13,5 M | 17,5 M | 44,2 M |
| Résultat d'exploitation stabilisé (an 2) | 9,1 M | 11,1 M | 7,6 M | 9,0 M |
| Rendement brut / net | 8,5 % / 5,8 % | 10,7 % / 8,9 % | 9,5 % / 4,2 % | 24,2 % / 5,0 % |
| **TRI 15 ans sans crédit** | **5,1 %** | **10,0 %** | **1,6 %** | **3,1 %** |
| TRI avec crédit (60 % du coût, 8,5 %, 15 ans) | 2,7 % | 11,0 % | -2,8 % | -0,1 % |
| TRI avec le foncier valorisé à 45 M | 2,6 % | 6,5 % | -0,4 % | 1,0 % |
| VAN à 10 % (sans crédit) | -55,0 M | -0,1 M | -98,2 M | -84,5 M |
| Couverture de la dette (an 2) | 0,83 | 1,27 | 0,69 | 0,82 |

HYPOTHÈSES

# Marché, coûts et exploitation

## Marché locatif (Riviera Palmeraie, janv.-févr. 2026)

| Typologie | Fourchette marché | Retenu (neuf, design) |
|---|---|---|
| Studio / T1 bis, nu | 90–160 k | 140 000 |
| 2 pièces, nu | 160–280 k | 230 000 |
| Meublé (prime) | +30 à 50 % | +40 % |
| Studio meublé, courte durée | ≈ 30 k / nuit | 28 000 / nuit |
| 2 pièces meublé, courte durée | — | 40 000 / nuit |

Sources : moyenne des annonces et agences d'Abidjan publiée début 2026 (blog.iambeezy.app, « prix des loyers à Abidjan par quartier ») et annonces de studios meublés à la Palmeraie (expat.com). Les loyers sont pris dans le haut de la fourchette pour un produit neuf, traversant, avec patio ou terrasse. Ils sont à confirmer auprès d'agences.

## Paramètres des scénarios

| Paramètre | S1 | S4 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| Occupation stabilisée | 92 % | 92 % | 85 % | 55 % |
| Occupation an 1 | 70 % | 70 % | 65 % | 40 % |
| Gestion / conciergerie | 10 % | 0 % | 10 % | 20 % |
| Charges incluses | 0 % | 0 % | 12 % | 18 % |
| Commission plateforme | 0 % | 0 % | 0 % | 15 % |
| Entretien | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| Fiscalité foncière (hyp.) | 7 % | 7 % | 7 % | 10 % |
| Provision mobilier (% / an) | 0 % | 0 % | 10 % | 15 % |


## Hypothèses générales (modifiables dans l'Excel)

| Hypothèse | Valeur |
|---|---|
| Cout du batiment locatif TTC (estimatif, prix / 2) | 152 004 401 |
| Permis, frais administratifs, raccordement, mise en location | 3 500 000 |
| Valeur du foncier (hypothese a confirmer), FCFA / m2 | 150 000 |
| Surface de la parcelle locative (m2) | 300 |
| Nombre de 2 pieces (48,6 m2) | 4 |
| Nombre de T1 bis (32,4 m2) | 2 |
| Loyer mensuel 2 pieces nu | 230 000 |
| Loyer mensuel T1 bis nu | 140 000 |
| Loyer mensuel 2 pieces meuble (moyenne duree) | 320 000 |
| Loyer mensuel T1 bis meuble (moyenne duree) | 200 000 |
| Nuitee 2 pieces (courte duree) | 40 000 |
| Nuitee T1 bis (courte duree) | 28 000 |
| Mobilier + equipement par 2 pieces | 4 500 000 |
| Mobilier + equipement par T1 bis | 3 000 000 |
| Indexation annuelle des loyers | 2,0 % |
| Indexation annuelle des charges fixes | 3,0 % |
| Assurance proprietaire (% du cout de construction / an) | 0,1 % |
| Gardiennage + entretien des parties communes (FCFA / an) | 1 200 000 |
| Taux de capitalisation pour la valeur de sortie (annee 15) | 10,0 % |
| Taux d'actualisation (VAN) | 10,0 % |
| Part financee par credit (du cout de construction TTC) | 60,0 % |
| Taux du credit immobilier | 8,5 % |
| Duree du credit (ans) | 15 |

TRAJECTOIRE ET SENSIBILITÉ

# Quand l'investissement est-il remboursé ?

Trésorerie cumulée sans crédit, en FCFA, valeur de revente exclue. Seul S4 rembourse l'investissement dans l'horizon. Investissement en année 0, mise en location en année 1 (montée en charge), loyers indexés de 2 % par an.

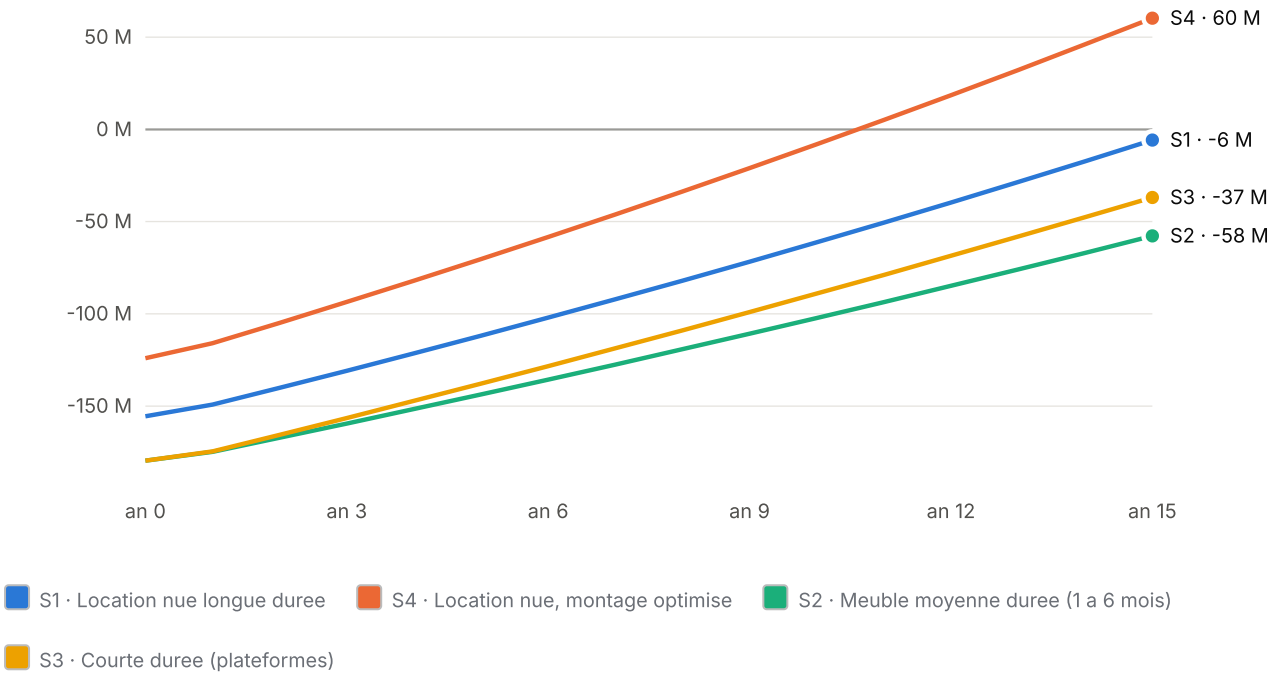


## TRI en location nue gérée par agence selon le coût et les loyers

| Base de coût | Loyers −10 % | Loyers cibles | Loyers +10 % |
|---|---|---|---|
| Prix base non divisés (TTC)<br>281,0 M | -1,9 %<br>net 2,7 % | -0,8 %<br>net 3,1 % | 0,2 %<br>net 3,5 % |
| TTC, entreprises assujetties<br>152,0 M | 3,9 %<br>net 5,2 % | 5,1 %<br>net 5,8 % | 6,3 %<br>net 6,5 % |
| HT (lots, artisans non assujettis)<br>128,8 M | 5,5 %<br>net 6,1 % | 6,9 %<br>net 6,9 % | 8,1 %<br>net 7,7 % |
| HT sans honoraires architecte<br>120,5 M | 6,3 %<br>net 6,5 % | 7,6 %<br>net 7,4 % | 8,9 %<br>net 8,2 % |

## Crédit : durée et couverture (S4, 60 % à 8,5 %)

| Durée | Annuité | Couverture | TRI avec crédit |
|---|---|---|---|
| 10 ans | 11,0 M | 1,01 | 10,6 % |
| 15 ans | 8,7 M | 1,27 | 11,0 % |
| 20 ans | 7,6 M | 1,45 | 11,3 % |

Une banque demande en général une couverture d'au moins 1,2. En S4, elle est atteinte dès 15 ans. Le capital restant dû à l'année 15 est déduit de la valeur de sortie.

# Plan de financement de l'opération complète

## Budget global (option B + locatif)

| Poste | FCFA |
|---|---|
| Villa option B : travaux, honoraires, aléas (TTC) | 190 494 027 |
| Bâtiment locatif (TTC) | 152 004 401 |
| Frais annexes villa et locatif (permis, raccordements, divers) | 7 000 000 |
| **Total à financer, entreprises TTC (hors foncier)** | **349 498 428** |
| Montage optimisé : lots HT, sans honoraires d'architecte | 278 534 459 |

## Phasage conseillé

| Phase | Contenu | Durée |
|---|---|---|
| 0 | Bornage, étude de sol, permis, clôture et mur séparatif | 3–4 mois |
| 1 | Bâtiment locatif, mise en location | 9–10 mois |
| 2 | Villa (les loyers, environ 1,1 M par mois, couvrent une partie des appels de fonds) | 12–14 mois |

Une installation de chantier commune aux deux ouvrages ferait gagner environ 2 à 3 % sur les travaux, mais elle repousse les premiers loyers d'un an.

## Risques principaux et parades

| Risque | Parade |
|---|---|
| Dérive des coûts (le ratio ÷ 2 est ambitieux) | Aux prix de base non divisés, le TRI devient négatif (-0,8 %). Marchés par lots à prix fermes, aléas de 10 %, consultation dès l'APS. |
| Loyers inférieurs aux cibles | À −10 % de loyers et au coût HT, le TRI tombe à 5,5 %. Le gardien, l'eau continue et la cuisine fermée soutiennent le loyer. |
| Vacance, impayés | Gestion par une agence (10 %), caution de 2 mois et avance de 2 mois, bail écrit. |
| Réglementaire (reculs, limite Est) | Certificat d'urbanisme avant l'APS. Si des reculs de 3 m sont imposés au Sud et à l'Est, la barre passe à 11,4 × 9,0 m (environ −20 %, 5 logements). |
| Termites, humidité (bois, terre) | Bois traités et certifiés, soubassements béton, débords. Les prototypes sont testés avant le marché. |
| Fiscalité foncière | Taux hypothétique de 7 %. À valider avec un fiscaliste, ainsi que les exonérations éventuelles pour construction neuve. |
